



【 前沿探索 】

【

】

【 党建引领 】

附：后勤保障部党政领导班子成员基本情况

【协同联动】

【工作部署】

【三全育人】

【条件保障】

【 校园管理 】

【 民生工程 】

【 督 导 工 作 】

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	中心校区南院1—6号楼屋顶维修改造。	赵元东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	
4	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
5	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
6	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和维修基金清理工作。	解国、董志川	12月31日	房改办公室、中心校区管理办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要

填表人：肖文杰


后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至9月25下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩（朝美）	口罩KF94	口罩N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒剂（L）	次氯消毒剂（L）	消毒片100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免洗手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	分免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）
中心校区	173	81600	20	120	0	62	105	125	94	55	24	160	407	6735	120	28	10	10	10	675	3208	852	1337	1	1	33	13	215	500
洪家楼校区	67	38793	0	60	0	33	31	61	38	16	11	316	91	1673	32	20	330	3910	236	1010	213	198	1	1	30	15	129	139	
趵突泉校区	109	31330	10	60	11	39	33	123	33	33	13	103	591	7533	30	30	339	1160	131	1003	393	1713	1	1	25	15	129	133	
千佛山校区	53	22550	0	60	0	36	15	139	18	37	13	117	181	3200	10	20	190	3110	117	809	263	1626	1	1	33	15	112	137	
饮食中心	2	100											1	130							2								
交通中心	2	160	10	0	0	0				2	0	0	1	73		0	0		0	3									
幼教中心		30	60											10															
后勤公司		50	60										12	0.5	60				50	3		1							


中心校区在建竣工项目施工进度（9.27）

序号	施工项目	开工时间	工期（天）	竣工时间	是否施工	项目进展情况
5	公共空间改造	7月10日	60	9月9日	是	
6	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	


千佛山校区未竣工项目施工进度 (9.27)



趵突泉校区未竣工项目施工进度 (9.27)

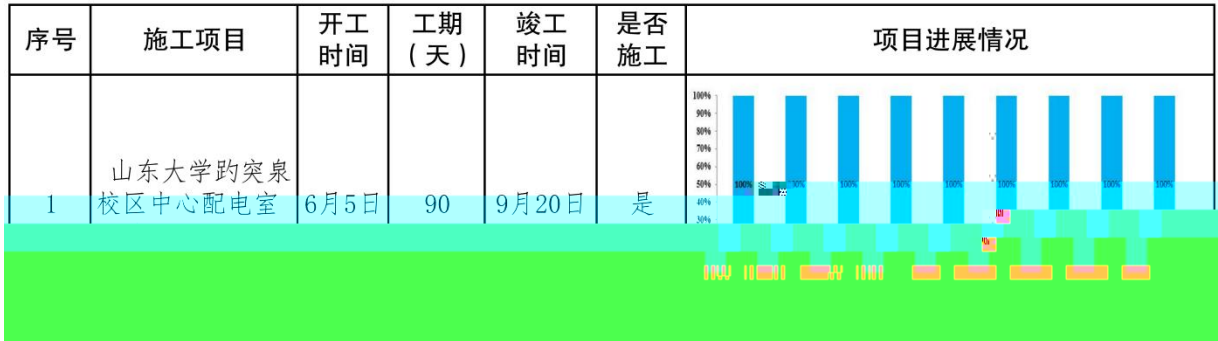

全国中楼



每周水改进展统计 (2020.9.19-9.25)

序号	校区	水改类型	安全区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	总校区	二供	两院	外管线施工100%完成,泵房改造完成	15-20号楼封楼完成30户。
2	家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外围管网及室内管网已铺设完毕,泵房改造已完成并投入使用,二宿舍室外水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	准备二宿舍1号楼一层消防用水、花坛绿化用水及换热站用水的水改材料准备工作
3				等待济南市城乡水务局批复过河道。	施工队已全面进场施工。上周五与管网公司沟通批复农村污水管网接入市政管网事宜。

每周水改进展统计 (2020.9.19-9.25)

序号	校区	水改类型	安全区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	总校区	二供	两院	外管线施工100%完成,泵房改造完成	15-20号楼封楼完成30户。
2	家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外围管网及室内管网已铺设完毕,泵房改造已完成并投入使用,二宿舍室外水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	准备二宿舍1号楼一层消防用水、花坛绿化用水及换热站用水的水改材料准备工作
3				等待济南市城乡水务局批复过河道。	施工队已全面进场施工。上周五与管网公司沟通批复农村污水管网接入市政管网事宜。
